


Verslag dijktafel 01

26 september 2017 – de Appelgaard

Aanwezige adressen:

O1	IJsseldijk Noord 344 IJsseldijk Noord 346 IJsseldijk Noord 347 IJsseldijk Noord 349 IJsseldijk Noord 351
----	--

Kansrijke alternatieven

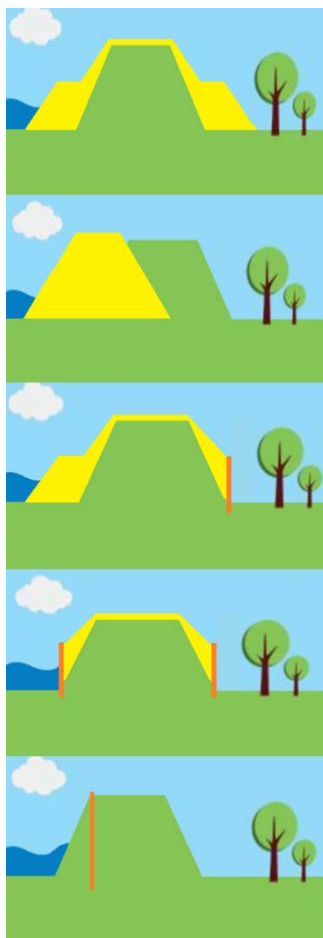

Grondoplossing beide zijden

Asverschuiving buitenwaarts

Grondoplossing buitenzijde, grondoplossing type 2 constructie binnenzijde (type 2 is een stabiliteitsscherm om de grond vast te houden)

Grondoplossing met type 2 constructie aan beide zijden

Type 1 – zelfstandig kerende constructie binnen of buitenzijde

Opbrengst van de dijkvaksessies:

Algemeen:

- De dijk zakt weg aan de buitenzijde (richting de rivier).

Kansrijk alternatief – grondoplossing binnen en buitenzijde

- Niet acceptabel in verband met de woningen aan de binnenzijde.

Kansrijk alternatief – buitenwaartse asverschuiving

- Heeft voorkeur voor de aanwezige bewoners. Vraag is of de bewoners van nr 343 en 342 dat ook zo zien. HHSK zal hierover met deze bewoners in gesprek gaan.

- Twee ideeën met betrekking tot de weg: of de weg op de huidige dijk behouden, zodat de nieuwe dijk ontlast wordt, of de weg verleggen naar de nieuwe dijk om de druk op de woningen te verminderen.
- Behoud van eigen gronden

Kansrijk alternatief – grondoplossing buitenzijde – grondoplossing met type 2 binnenzijde

- niet acceptabel in verband met de woningen aan de binnenzijde.

Kansrijk alternatief – grondoplossing met type 2 buiten en binnenzijde

- niet acceptabel in verband met woningen aan binnenzijde.
- wel een kans als de hele dijk verplaatst wordt naar de rivierzijde

Kansrijk alternatief - damwand

- Geen voorkeur i.v.m. teveel trillingen aan de oude woningen die er staan (niet onderheid).

Vragen

- Waar liggen in dit dijkvak de kabels en leidingen

Conclusie met betrekking tot draagvlak voor dijkvak O1

Voorkeur van de bewoners was een buitenwaartse asverschuiving.

Bijlage - Foto met opbrengst van de avond

